

ESTADO DE SITUACIÓN

Ejecución Presupuestaria FNDR


Febrero 2026

División de Presupuesto e Inversión Regional
Gobierno Regional de Los Lagos




www.gorelосlagos.cl

MARCO PRESUPUESTARIO FNDR – Programa 02 2026

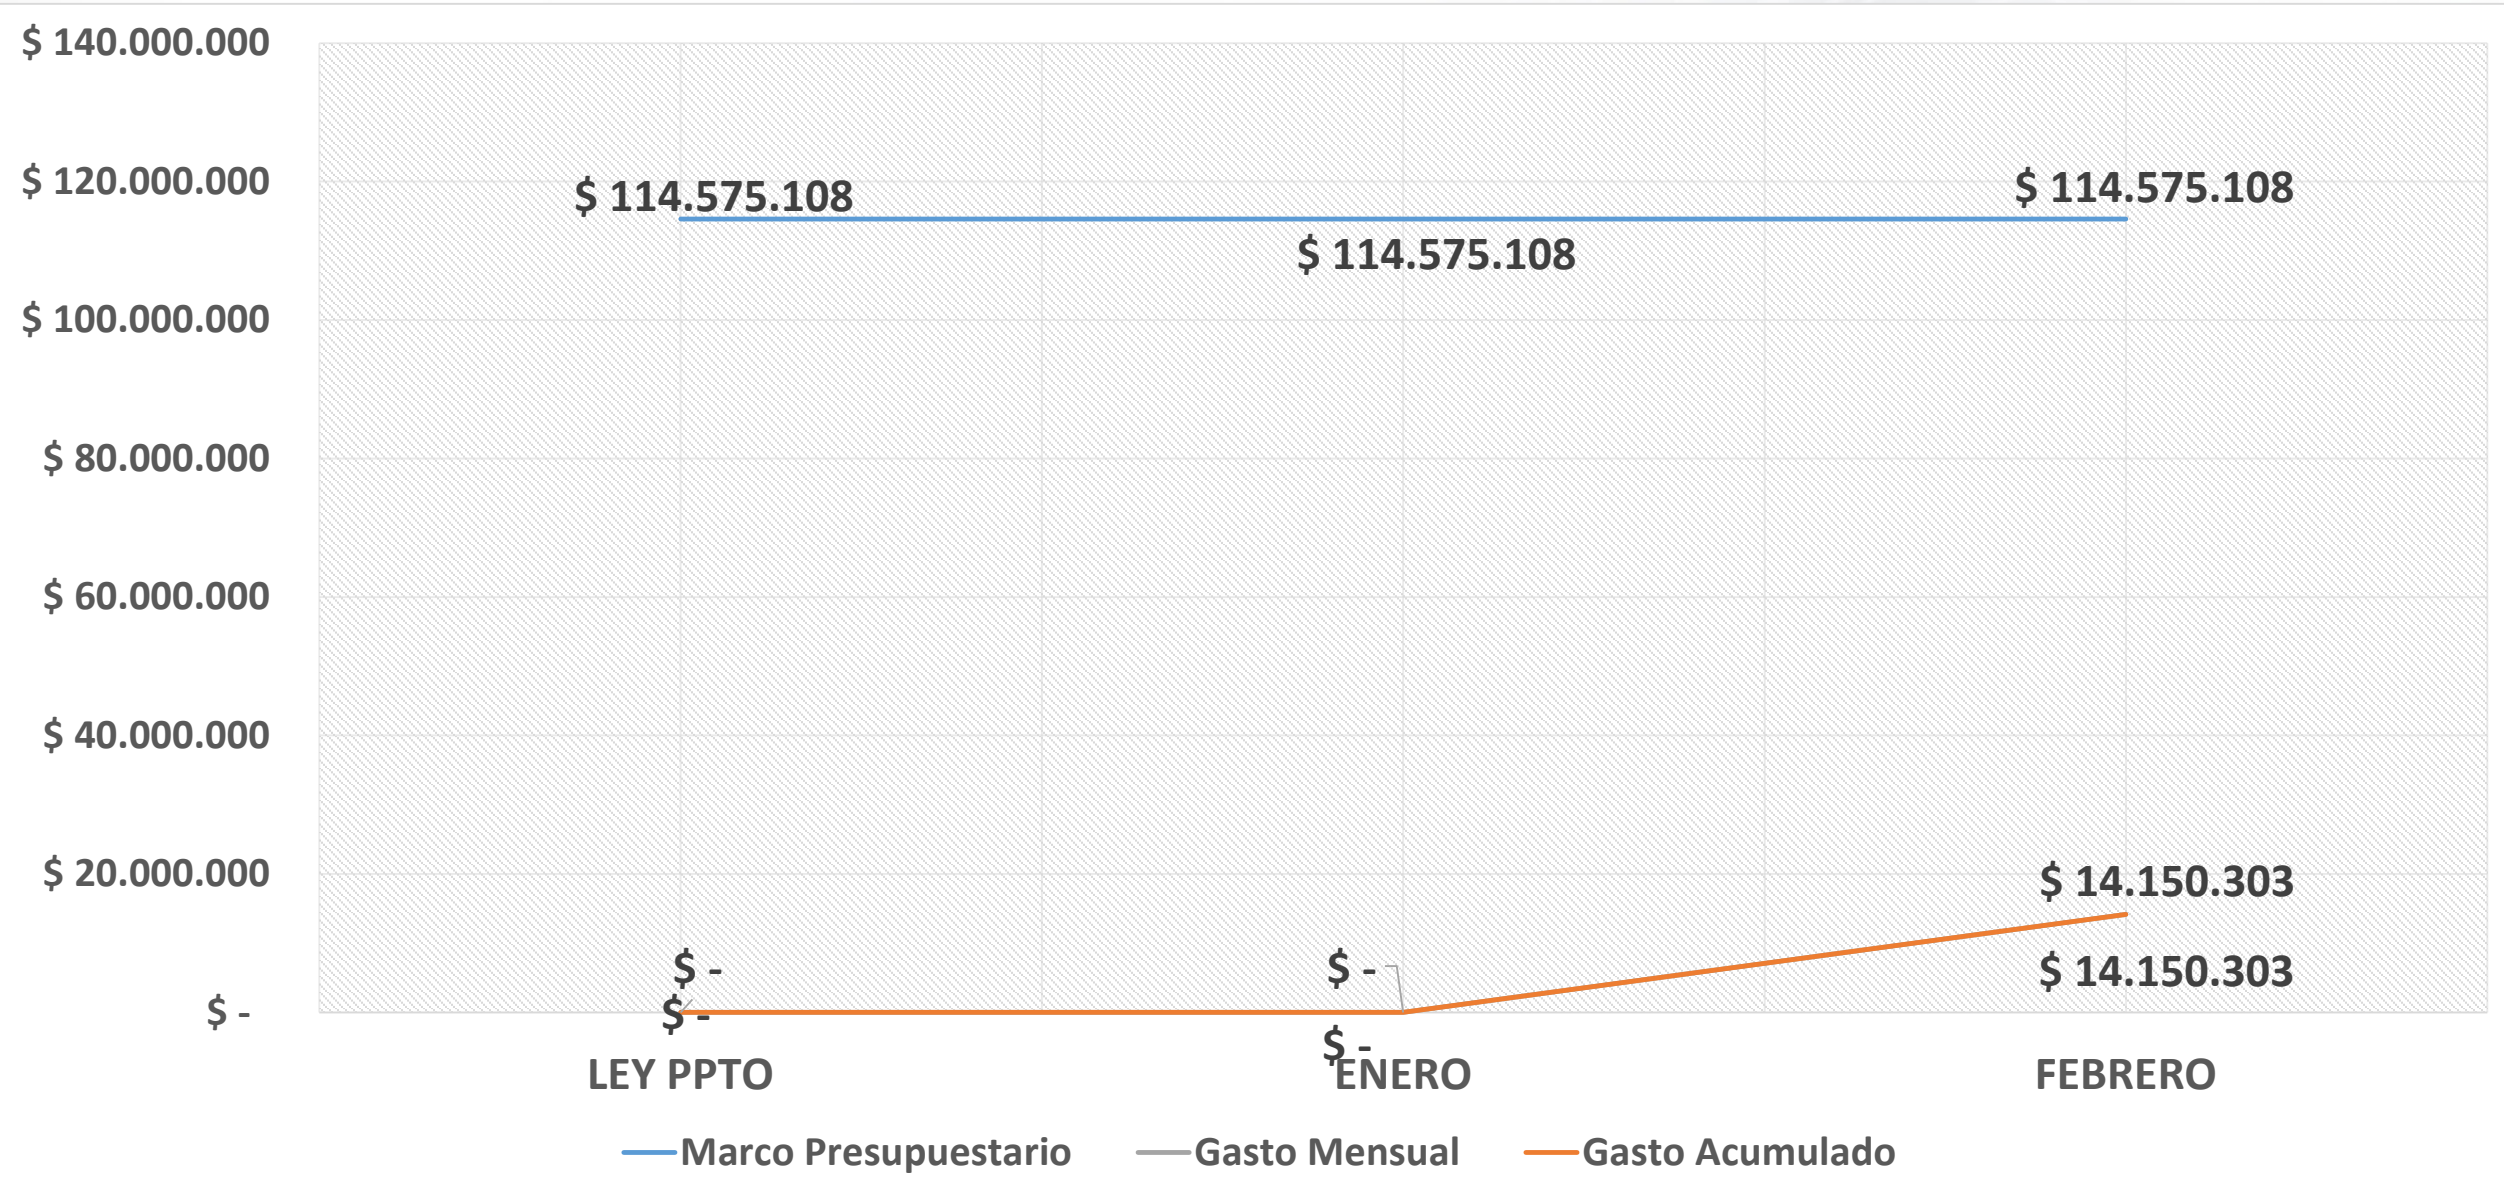

EFICIENCIA PRESUPUESTARIA FNDR


Programa 02 2026

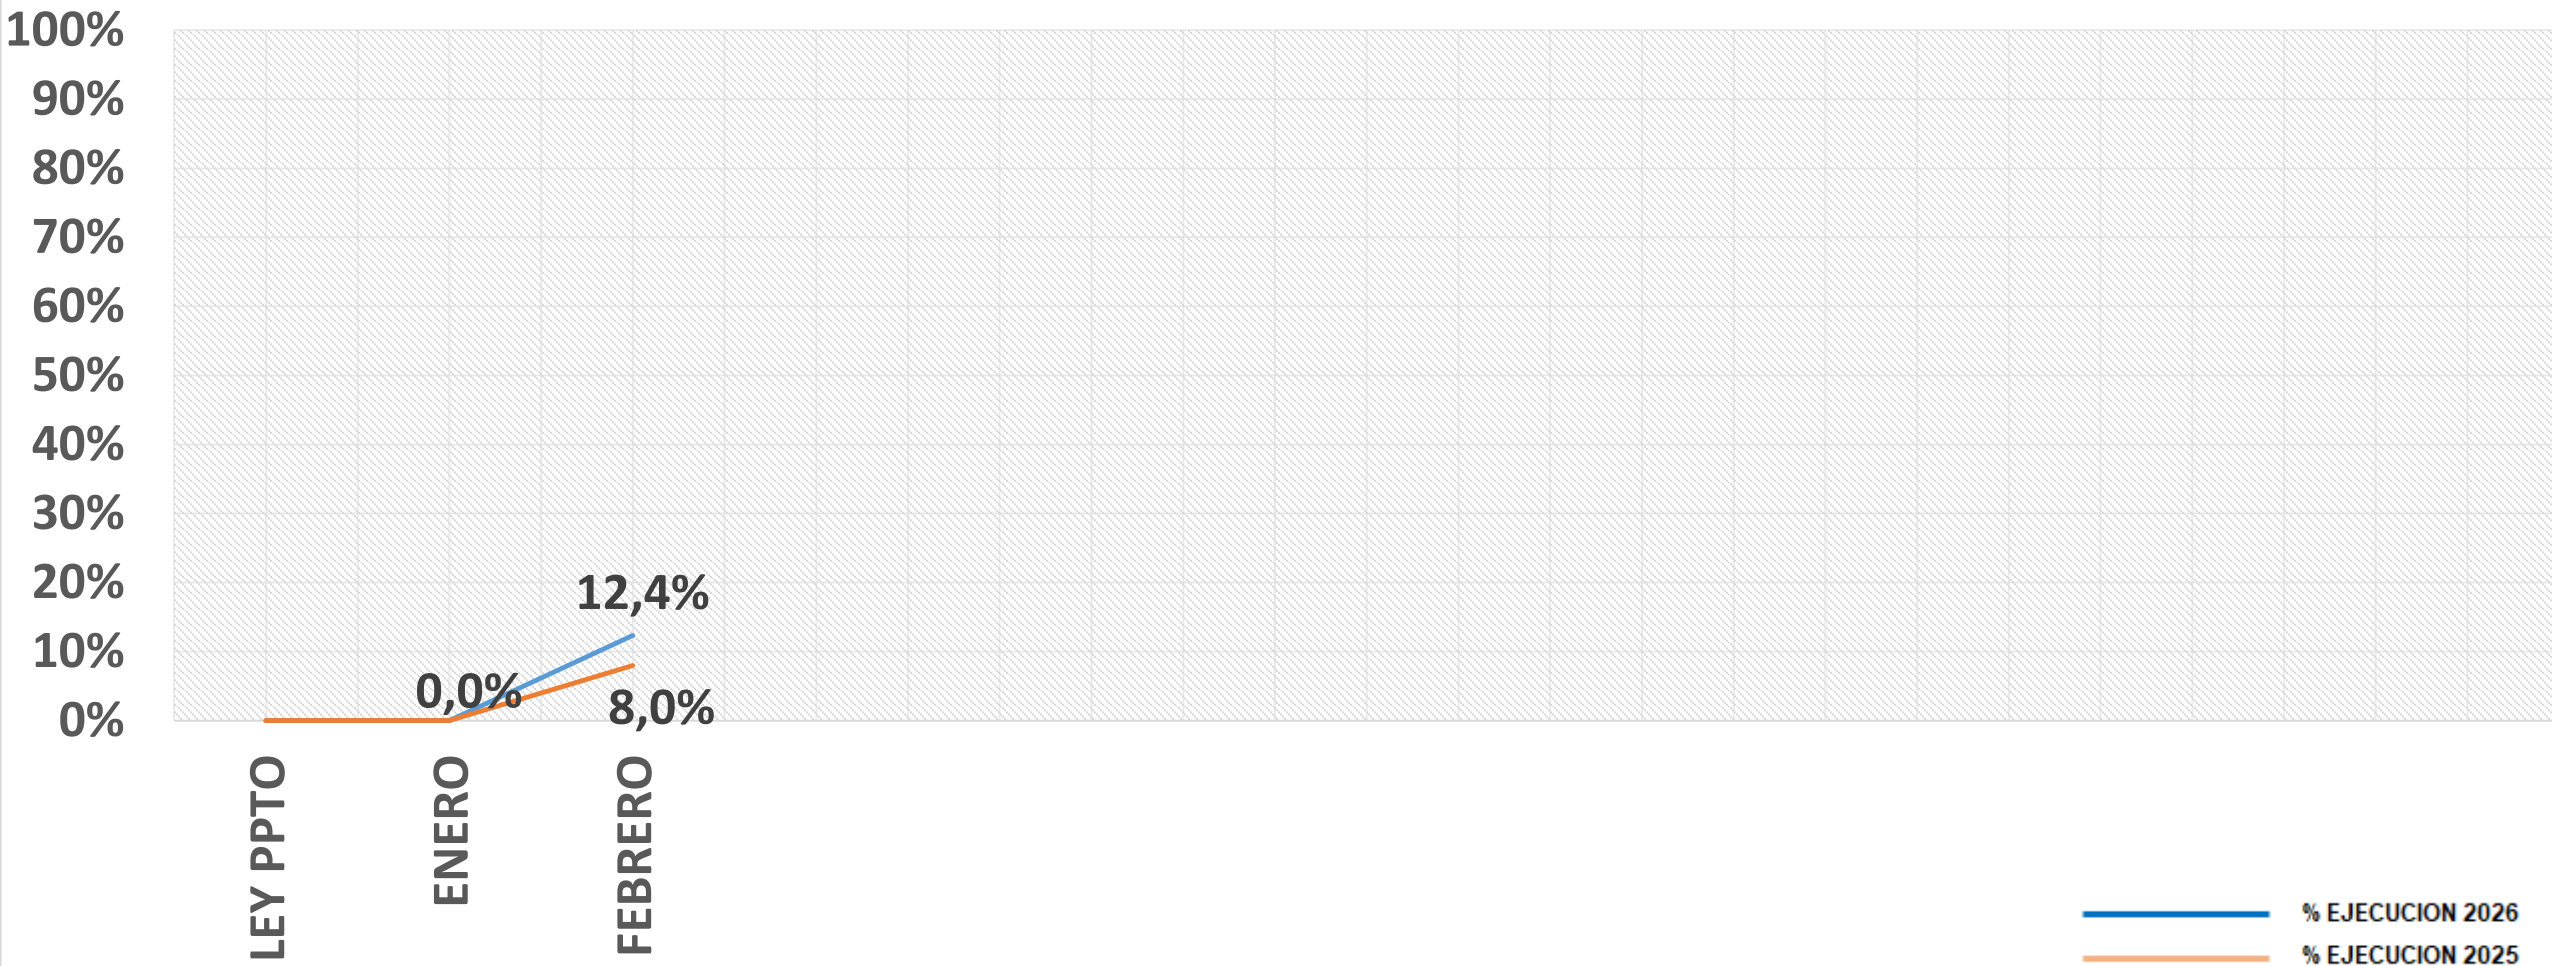


%EJECUCION CON ANTICIPOS Y PRESUPUESTO 2026 15%
PRESUPUESTO 2026 M\$ 114.575.108
GASTO + ANTICIPO M\$ 17.586.169

Eficiencia Presupuestaria por Provincia

al 28 Febrero

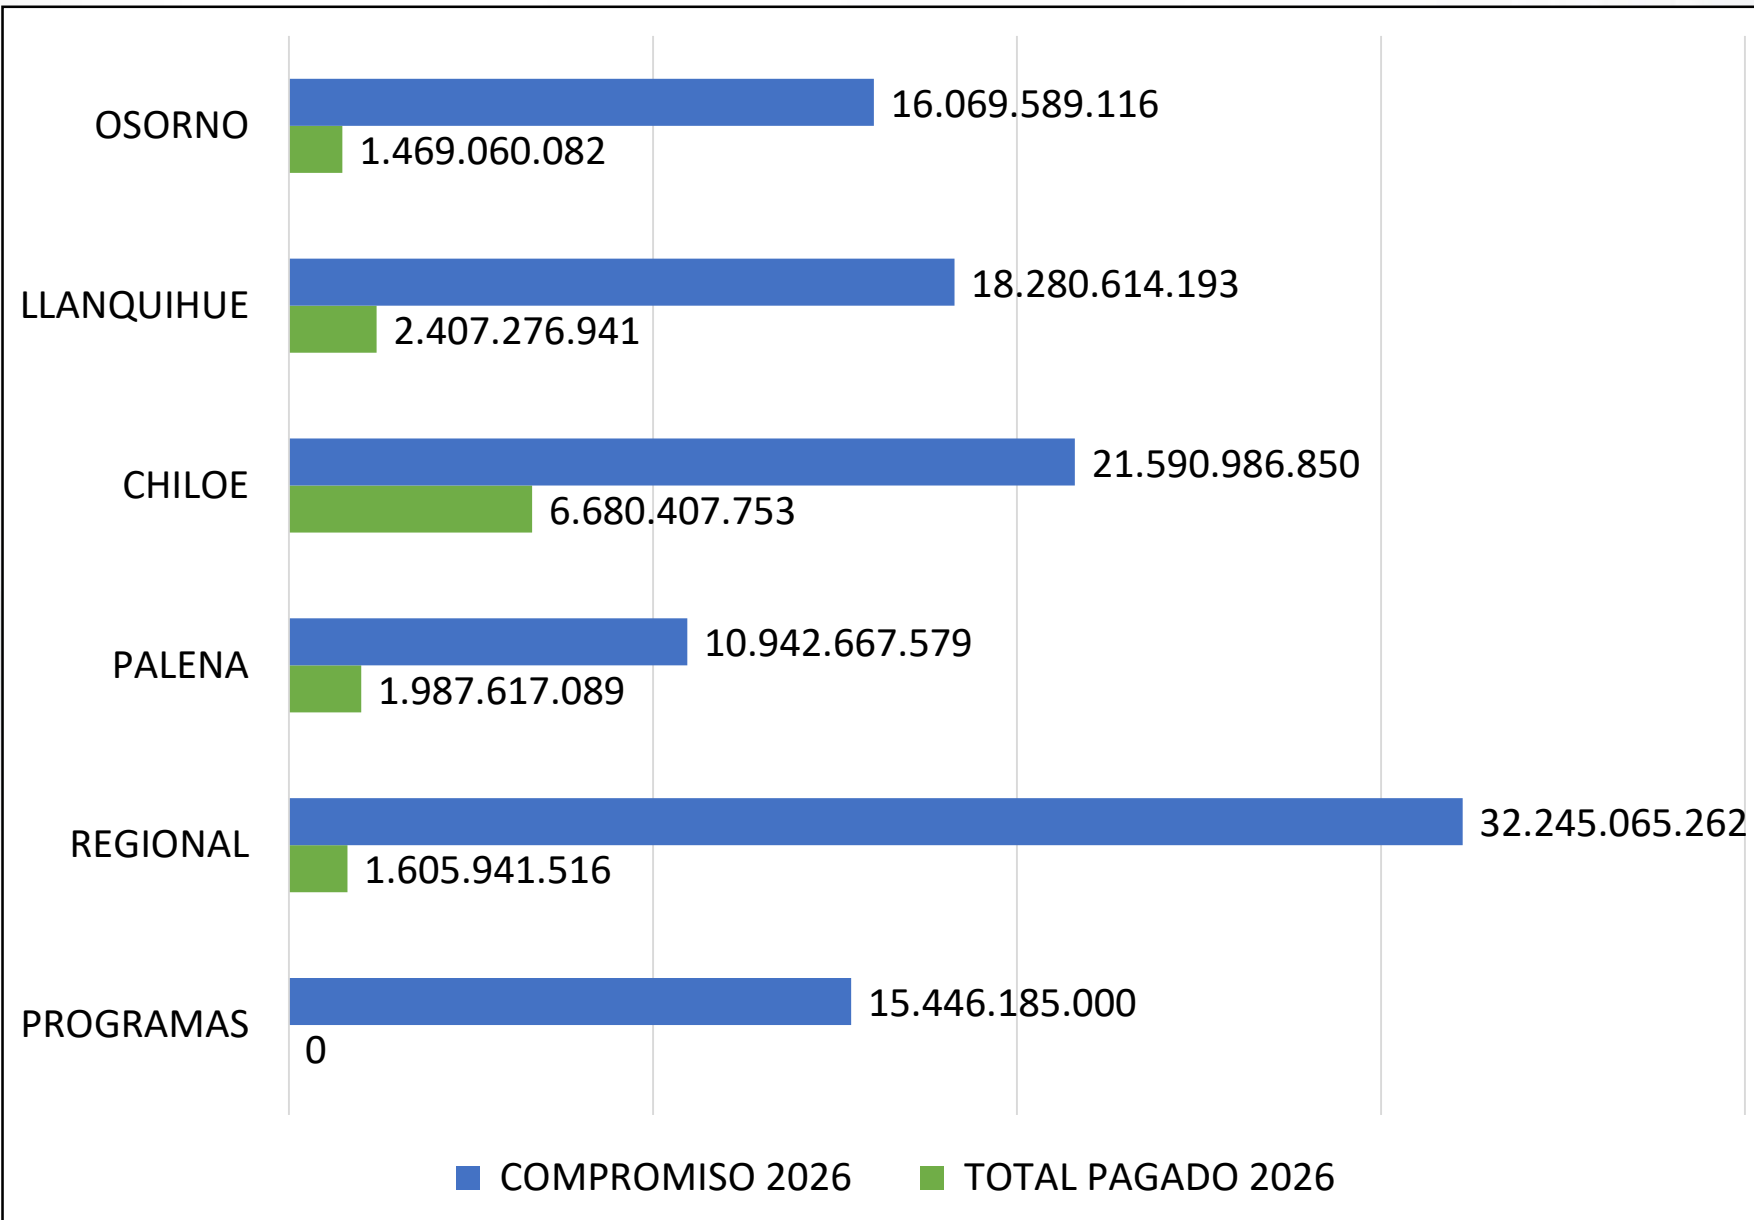

% Distribución por Provincia



Resumen Ejecución por Provincia

PROVINCIA	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
OSORNO	9,14%	14.600.529.034
LLANQUIHUE	13,17%	15.873.337.252
CHILOE	30,94%	14.910.579.097
PALENA	18,16%	8.955.050.490
REGIONAL	4,98%	30.639.123.746
PPTO TERRITORIAL		84.978.619.619
PROGRAMAS	0,00%	15.446.185.000
TOTAL	12,35%	100.424.804.619

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROVINCIA



Detalle Provincia de Osorno

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PROV. OSORNO	4	10.458.415.000	10%	5.362.729.887	1.059.713.441	7%	0	0,00%	1.059.713.441
OSORNO	26	56.448.071.756	54%	28.584.693.652	8.002.182.299	53%	397.360.196	4,97%	7.604.822.103
PTO. OCTAY	3	3.288.180.000	3%	266.506.973	622.607.606	4%	266.147.501	42,75%	356.460.105
PURRANQUE	6	6.592.068.000	6%	2.372.200.594	1.354.526.162	9%	471.316.000	34,80%	883.210.162
PUYEHUE	3	8.923.043.000	9%	623.540.695	153.867.605	1%	0	0,00%	153.867.605
RIO NEGRO	8	7.326.226.000	7%	3.649.719.245	1.729.516.901	12%	85.069.635	4,92%	1.644.447.266
SAN JUAN DE LA COSTA	5	8.883.283.000	9%	2.552.398.902	1.562.498.000	10%	2.450.000	0,16%	1.560.048.000
SAN PABLO	6	2.437.187.000	2%	52.851.234	515.427.216	3%	246.716.750	47,87%	268.710.466
TOTAL	61	104.356.473.756	100%	43.464.641.182	15.000.339.230	100%	1.469.060.082	9,79%	13.531.279.148

Detalle Provincia de Llanquihue

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		FNDR 2026					
		COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
P. MONTT	16	42.093.713.997	30%	25.250.067.910	2.613.899.300	16%	589.027.217	23%	2.024.872.083
CALBUCO	7	24.311.196.839	17%	15.323.922.326	3.463.802.280	21%	0	0%	3.463.802.280
COCHAMO	10	12.213.494.958	9%	433.252.857	1.461.667.178	9%	69.979.102	5%	1.391.688.076
FRESIA	5	6.440.226.763	5%	1.396.135.315	983.256.058	6%	105.885.368	11%	877.370.690
FRUTILLAR	9	7.900.115.598	6%	1.018.490.915	1.598.528.813	10%	1.034.644.112	65%	563.884.701
LLANQUIHUE	2	837.845.000	1%	201.612.460	636.232.540	4%	341.530.000	54%	294.702.540
LOS MUERMOS	3	4.042.643.858	3%	556.757.937	250.000.000	2%	0	0%	250.000.000
MAULLIN	10	7.031.091.681	5%	6.248.174	1.933.395.476	12%	94.010.000	5%	1.839.385.476
P.VARAS	11	14.795.328.820	10%	6.296.286.982	1.760.258.756	11%	73.384.436	4%	1.686.874.320
PROV.LLANQUIHUE	7	21.874.813.039	15%	10.097.399.684	1.587.211.287	10%	98.816.706	6%	1.488.394.581
TOTAL	80	141.540.470.553	100%	60.580.174.560	16.288.251.688	100%	2.407.276.941	15%	13.880.974.747

Detalle Provincia de Chiloé

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
		COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PROV. CHILOE	6	36.354.679.434	31%	15.305.116.625	1.654.411.404	11%	1.690.973.569	102%	-36.562.165
ANCUD	11	10.228.993.000	9%	4.117.579.407	1.673.447.442	12%	506.645.833	30%	1.166.801.609
CASTRO	5	19.490.791.000	16%	7.387.331.510	4.175.211.012	29%	2.112.306.781	51%	2.062.904.231
CHONCHI	10	14.893.930.367	13%	3.186.877.673	1.875.854.969	13%	734.603.030	39%	1.141.251.939
CURACO DE VÉLEZ	4	1.523.015.412	1%	438.653.115	744.831.713	5%	2.999.588	0%	741.832.125
DALCAHUE	9	11.265.234.060	10%	1.451.921.643	1.207.007.695	8%	173.650.474	14%	1.033.357.221
PUQUELDON	5	7.632.388.000	6%	3.471.097.721	236.295.103	2%	1.199.065.671	507%	-962.770.568
QUEILEN	1	3.073.922.000	3%	1.045.300.291	50.000.000	0%	0	0%	50.000.000
QUELLON	5	2.292.531.146	2%	158.846.000	719.359.000	5%	0	0%	719.359.000
QUEMCHI	3	3.330.105.789	3%	1.485.286.866	766.921.134	5%	0	0%	766.921.134
QUINCHAO	5	8.408.152.000	7%	2.647.462.420	1.292.239.625	9%	260.162.807	20%	1.032.076.818
TOTAL	64	118.493.742.208	100%	40.695.473.271	14.395.579.097	100%	6.680.407.753	46%	7.715.171.344

Detalle Provincia de Palena

PROVINCIA	INICIATIVAS	COSTO	%	PAGOS AÑOS ANTERIORES	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
PROV. PALENA	5	102.648.720.000	80%	27.247.619.428	6.689.443.412	75%	1.869.939.407	28%	4.819.504.005
CHAITEN	3	10.810.929.000	8%	25.800.000	217.200.000	2%	0	0%	217.200.000
FUTALEUFU	6	2.761.920.000	2%	220.257.047	618.558.000	7%	0	0%	618.558.000
HUALAIHUE	7	4.551.342.000	4%	1.429.620.291	988.610.704	11%	117.677.682	12%	870.933.022
PALENA	5	6.838.770.000	5%	1.415.196.686	441.238.374	5%	0	0%	441.238.374
TOTAL	26	127.611.681.000	100%	30.338.493.452	8.955.050.490	100%	1.987.617.089	22%	6.967.433.401

Eficiencia por Provisión

Al 28 Febrero

FONDO	PROGRAMA	MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2026 - PROGRAMA 02				COMPROMISO V/S PAGOS 2026 - PROGRAMA 02			
		MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	DIFERENCIA	COMPROMISO 2026	PAGOS 2026	% EJECUCION	SALDO A DICIEMBRE
LIBRE	LIBRE	70.840.920.000	60.820.676.067	53,08%	10.020.243.933	60.820.676.067	8.167.023.111	13,43%	52.653.652.956
FAR	FONDO APOYO REGIONAL	21.235.317.000	21.080.264.516	18,40%	155.052.484	21.080.264.516	2.860.218.362	13,57%	18.220.046.154
PEDZE	PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	0	7.314.954.193	6,38%	-7.314.954.193	7.314.954.193	1.615.356.979	22,08%	5.699.597.214
TR	TERRITORIOS REZAGADOS	0	1.291.103.960	1,13%	-1.291.103.960	1.291.103.960	0	0,00%	1.291.103.960
FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	8.000.000.000	6,98%	0	8.000.000.000	1.507.704.929	18,85%	6.492.295.071
ENERGIZACION	ENERGIZACION	0	849.522.273	0,74%	-849.522.273	849.522.273	0	0,00%	849.522.273
FRPD	FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	14.498.871.000	14.498.871.000	12,65%	0	14.498.871.000	0	0,00%	14.498.871.000
PIRDT	INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0	136.655.079	0,12%	-136.655.079	136.655.079	0	0,00%	136.655.079
SS	SANEAMIENTO SANITARIO	0	385.947.977	0,34%	-385.947.977	385.947.977	0	0,00%	385.947.977
PVP	PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO	0	196.112.935	0,17%	-196.112.935	196.112.935	0	0,00%	196.112.935
RSD	RESIDUOS SOLIDOS	0	1.000.000	0,00%	-1.000.000	1.000.000	0	0,00%	1.000.000
TOTAL	TOTAL	114.575.108.000	114.575.108.000	100%	0	114.575.108.000	14.150.303.381	12%	100.424.804.619

Eficiencia por Subtítulo

Al 28 Febrero

PROGRAMA 02 - FNDR 2026

SUBTITULO	COSTO	TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES	MARCO DECRETADO	COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
22 Estudios e investigaciones	2.134.906.000	392.207.500	469.292.000	469.292.000	0,41%	0	0,00%	469.292.000
24 Transferencias Corrientes	20.118.083.000	2.026.022.000	16.884.901.000	16.884.901.000	14,74%	2.031.885.364	12,03%	14.853.015.636
26 Otros Gastos Corrientes	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0,13%	0	0,00%	150.000.000
29 Activos no Financieros	23.477.882.140	5.529.299.633	11.356.612.000	11.356.612.000	9,91%	2.206.516.066	19,43%	9.150.095.934
31 Iniciativas de Inversión	500.885.862.377	170.435.508.081	54.103.669.000	54.103.669.000	47,22%	8.404.197.022	15,53%	45.699.471.978
33 Transferencias de Capital	64.695.693.838	7.760.205.405	31.610.634.000	31.610.634.000	27,59%	1.507.704.929	4,77%	30.102.929.071
	611.462.427.355	186.143.242.619	114.575.108.000	114.575.108.000	100%	14.150.303.381	12%	100.424.804.619

Eficiencia por Sector

Al 28 Febrero

SECTOR	COSTO TOTAL		PAGOS AÑOS ANTERIORES	FNDR 2026				
	COSTO	%		COMPROMISO 2026	% DIST. DEL COMPROMISO	TOTAL PAGADO 2026	% EJECUCION	SALDO DICIEMBRE
TRANSPORTE	190.970.847.446	31,23%	46.612.552.431	24.043.116.363	21%	2.860.218.362	11,90%	21.182.898.001
SALUD	117.066.494.499	19,15%	38.867.194.368	15.953.259.220	14%	2.224.372.840	13,94%	13.728.886.380
EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	102.514.069.583	16,77%	44.364.850.249	16.452.247.123	14%	2.918.884.835	17,74%	13.533.362.288
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	35.493.483.550	5,80%	21.648.131.762	541.718.554	0%	0	0,00%	541.718.554
RECURSOS HIDRICOS	24.259.272.938	3,97%	6.488.019.994	2.883.690.655	3%	298.656.696	10,36%	2.585.033.959
MULTISECTORIAL	51.477.992.960	8,42%	5.842.343.514	30.825.766.498	27%	2.489.577.367	8,08%	28.336.189.131
SEGURIDAD PUBLICA	20.381.785.933	3,33%	7.640.562.234	5.772.158.367	5%	481.658.055	8,34%	5.290.500.312
DEPORTES	30.619.345.022	5,01%	7.627.485.640	5.038.501.747	4%	866.127.949	17,19%	4.172.373.798
TURISMO Y COMERCIO	3.832.000.000	0,63%	1.681.338.819	1.499.836.000	1%	0	0,00%	1.499.836.000
ENERGIA	9.059.156.000	1,48%	125.778.069	5.393.619.473	5%	2.010.807.277	37,28%	3.382.812.196
PESCA	2.900.000.000	0,47%	604.099.000	1.295.901.000	1%	0	0,00%	1.295.901.000
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	13.713.736.546	2,24%	1.484.547.941	2.710.396.000	2%	0	0,00%	2.710.396.000
AGRICULTURA	5.869.551.878	0,96%	3.156.338.598	2.158.897.000	2%	0	0,00%	2.158.897.000
JUSTICIA	3.304.691.000	0,54%	0	6.000.000	0%	0	0,00%	6.000.000
TOTAL	611.462.427.355	100%	186.143.242.619	114.575.108.000	100%	14.150.303.381	12%	100.424.804.619

SUB T.	ITEM	SECTOR	PROVISION	ETAPA	BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO	GASTOS AÑOS ANTERIORES	PAGADO 2026	COMPROMISO 2026	SALDO COMPROMISO	PPTO FUTURO	RATE 2026	SITUACION GENERAL
						COMUNA DE OSORNO								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30043744	MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO.	8.031.757.432	7.880.905.650	0	1.000.000	1.000.000	149.851.782	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30070862	REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO.	22.210.242.780	5.657.190.512	0	5.795.005.420	5.795.005.420	10.758.046.848	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008282	REPOSICION SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE OSORNO	1.400.394.544	1.388.058.496	0	1.000.000	1.000.000	11.336.048	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30257472	CONSTRUCCION RED DE ALcantarillado Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO	699.055.000	47.479.757	0	50.000.000	50.000.000	601.575.243	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	DISEÑO	40016735	RESTAURACION CENTRO CULTURAL SOFÍA HOTT, OSORNO	193.804.000	112.067.112	0	64.707.959	64.707.959	17.028.929	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40005715	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE, OSORNO	511.250.000	329.270.698	0	181.979.302	181.979.302	0	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40015398	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL POBLACIÓN CARLOS CONDELL, OSORNO	930.411.000	502.435.848	397.360.196	427.975.152	30.614.956	0	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40032254	MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR, OSORNO	1.581.965.000	1.421.679.579	0	1.000.000	1.000.000	159.285.421	RS	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	EJECUCION	40015396	REPOSICION JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, OSORNO	3.275.092.000	0	0	5.000.000	5.000.000	3.270.092.000	RS	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019022	REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN ANGULO COMUNA OSORNO	722.229.000	704.555.415	0	1.000.000	1.000.000	16.673.585	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40028984	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, OSORNO	608.394.000	593.199.190	0	1.000.000	1.000.000	14.194.810	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039544	MEJORAMIENTO PLAZA WECHENEWEN, VILLA LOLOLHUE, OSORNO	365.776.000	359.879.295	0	1.000.000	1.000.000	4.896.705	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40039724	CONSERVACION CALLE ELEUTERIO RAMÍREZ, OSORNO	743.283.000	688.311.832	0	1.000.000	1.000.000	53.971.168	RS*	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40054693	MEJORAMIENTO PLAZA SAN RAMÓN, OSORNO	346.695.000	331.349.517	0	1.000.000	1.000.000	14.345.483	RS	EJECUCION
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	644.665.000	0	0	322.332.500	322.332.500	322.332.500	RS*	LICITACION
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40053613	REPOSICION DE VEHÍCULOS - MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, PARA RSD	304.640.000	0	0	304.640.000	304.640.000	0	RS*	LICITACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40019026	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, OSORNO	2.748.864.000	2.548.519.676	0	1.000.000	1.000.000	199.344.324	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30463800	REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO	5.082.704.000	4.457.537.952	0	1.000.000	1.000.000	624.166.048	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40037470	MEJORAMIENTO PLAZA LAS AMERICAS, POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, OSORNO	571.333.000	549.889.089	0	1.000.000	1.000.000	20.443.911	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40004690	MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO	1.127.041.000	1.012.364.034	0	114.676.966	114.676.966	0	RS	EJECUCION
TOTAL							52.099.595.756	28.584.693.652	397.360.196	7.277.317.299	6.879.957.103	16.237.584.805		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40042947	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE CHILLÁN , ENTRE AV. REPÚBLICA Y C.TEMUCO,OSORNO	1.456.900.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.356.900.000	RS	CONVENIO
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40039803	CONSTRUCCION CUARTEL BRIGADA DE BOMBEROS CANCURA, OSORNO	593.692.000	0	0	100.000.000	100.000.000	493.692.000	RS	Enviado a Unidad Técnica a Licitar
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40030820	CONSTRUCCION SALA DE ACOGIDA INTERCULTURAL (SRUKA) HOSPITAL BASE SAN JOSE, OSORNO	429.057.000	0	0	100.000.000	100.000.000	329.057.000	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40059081	CONSERVACION FERIA PEDRO AGUIRRE CERDA OSORNO	507.089.000	0	0	350.000.000	350.000.000	157.089.000	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40062270	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIÓN JUAN DE DIOS GUAJARDO, OSORNO	204.510.000	0	0	50.000.000	50.000.000	154.510.000	RS*	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40054690	REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA PAMPA SHILLING, OSORNO	43.865.000	0	0	23.865.000	23.865.000	20.000.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059784	REPOSICION CALLE PARALELA HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, FRANCKE OSORNO	1.113.363.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.112.363.000	RS	CONVENIO
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							4.348.476.000	0	0	724.865.000	724.865.000	3.623.611.000		
TOTAL COMUNA DE OSORNO							56.448.071.756	28.584.693.652	397.360.196	8.002.182.299	7.604.822.103	19.861.195.805		
						COMUNA DE PUERTO OCTAY								
						INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO								
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041629	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RUPANCO, COMUNA PUERTO OCTAY	1.158.223.000	21.934.080	0	300.000.000	300.000.000	836.288.920	RS	EJECUCION
TOTAL							1.158.223.000	21.934.080	0	300.000.000	300.000.000	836.288.920		
						INICIATIVAS NUEVAS								
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40051437	CONSERVACION DE 16 CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTORES RURALES, COMUNA DE PUERTO OCTAY	570.975.000	244.572.893	266.147.501	326.402.107	60.254.606	0	RS*	CONVENIO
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041628	ADQUISICION AMBULANCIA EMERGENCIA BASICA CECOSF CASCADAS, COMUNA PUERTO OCTAY	98.353.000	0	0	98.353.000	98.353.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041382	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO, COMUNA DE PUERTO OCTAY	1.197.961.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.147.961.000		
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40075708	MEJORAMIENTO MULTICACHA TECHADA ESCUELA ALBERTO HURTADO COMUNDA DE PUERTO OCTAY	262.668.000	0	0	114.000.000	114.000.000	148.668.000		
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							2.129.957.000	244.572.893	266.147.501	588.755.107	322.607.606	1.296.629.000		
TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY							3.288.180.000	266.506.973	266.147.501	888.755.107	622.607.606	2.132.917.920		

COMUNA DE PURRANQUE**INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30068433	CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE	1.593.749.000	865.213.301	0	250.000.000	250.000.000	478.535.699	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40032775	CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES DE PURRANQUE	1.176.646.000	1.056.428.269	0	80.000.000	80.000.000	40.217.731	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30171924	REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE	1.232.931.000	0	0	618.544.000	618.544.000	614.387.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041500	MEJORAMIENTO 4 CALLES DE CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	1.170.070.000	450.559.024	471.316.000	662.298.162	190.982.162	57.212.814	RS	EJECUCION
TOTAL							5.173.396.000	2.372.200.594	471.316.000	1.610.842.162	1.139.526.162	1.190.353.244		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40047721	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LOS ANGELES, PURRANQUE	46.499.000	0	0	15.000.000	15.000.000	24.625.000	RS	CONVENIO
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40033259	REPOSICION CUARTEL CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PURRANQUE	1.372.173.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.172.173.000	RS	licitacion
TOTAL INICIATIVAS NUEVAS							1.418.672.000	0	0	215.000.000	215.000.000	1.196.798.000		

TOTAL COMUNA DE PURRANQUE

6.592.068.000	2.372.200.594	471.316.000	1.825.842.162	1.354.526.162	2.387.151.244
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

COMUNA DE PUYEHUE**INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40018788	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS 12 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUYEHUE	633.888.000	585.020.395	0	48.867.605	48.867.605	0	RS*	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30070314	REPOSICION ESCUELA ESTACION NUEVO PORVENIR, PUYEHUE	196.372.000	38.520.300	0	55.000.000	55.000.000	102.851.700	RS	EJECUCION
TOTAL							830.260.000	623.540.695	0	103.867.605	103.867.605	102.851.700		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40004341	MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS, PUYEHUE	8.092.783.000	0	0	50.000.000	50.000.000	8.042.783.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							8.092.783.000	0	0	50.000.000	50.000.000	8.042.783.000		

TOTAL COMUNA DE PUYEHUE

8.923.043.000	623.540.695	0	153.867.605	153.867.605	8.145.634.700
----------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------------------

COMUNA DE RIO NEGRO**INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40008370	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO	1.147.632.000	1.054.667.638	0	54.251.065	54.251.065	38.713.297	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30280673	CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN, RIO NEGRO	1.052.271.000	999.242.248	0	8.318.258	8.318.258	44.710.494	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40010103	CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO	1.299.153.000	1.054.987.961	0	240.292.625	240.292.625	3.872.414	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013103	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUILMA, COMUNA DE RIO NEGRO	1.103.844.000	21.312.000	0	519.689.986	519.689.986	562.842.014	RS	EJECUCION
TOTAL							4.602.900.000	3.130.209.847	0	822.551.934	822.551.934	650.138.219		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052927	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR MILLACURA, COMUNA DE RIO NEGRO	505.990.000	0	0	50.000.000	50.000.000	455.990.000	RS	Enviado a Unidad Técnica a Licitar
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032117	CONSERVACION CAMINOS VECINALES DE ÑANCUÁN CHANCHAN, SAN FLORENTINO Y QUISQUELELFUN, RÍO NEGRO	1.065.206.000	519.509.398	85.069.635	545.696.602	460.626.967	0	RS*	EJECUCION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	30097977	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL, COMUNA RIO NEGRO	805.792.000	0	0	50.000.000	50.000.000	755.792.000	RS	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40073026	REPOSICION DOS CAMIONES TOLVA PARA LA COMUNA DE RIO NEGRO	346.338.000	0	0	346.338.000	346.338.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.723.326.000	519.509.398	85.069.635	992.034.602	906.964.967	1.211.782.000		

TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO

7.326.226.000	3.649.719.245	85.069.635	1.814.586.536	1.729.516.901	1.861.920.219
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA**INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA	5.908.118.000	1.358.927.420	2.450.000	1.200.000.000	1.197.550.000	3.349.190.580	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30291073	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE, SAN JUAN DE LA COSTA	1.211.618.000	1.193.471.482	0	1.000.000	1.000.000	17.146.518	RS	EJECUCION
31	02	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019284	CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SECTOR LA BARRA DEL RIO BUENO, SAN JUAN DE LA COSTA	511.498.000	0	0	110.498.000	110.498.000	401.000.000	RS	licitacion
TOTAL							7.631.234.000	2.552.398.902	2.450.000	1.311.498.000	1.309.048.000	3.767.337.098		

INICIATIVAS NUEVAS

29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40066529	ADQUISICION CAMION RECOLECTOR RSD SAN JUAN DE LA COSTA	250.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071828	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUIZAS-CHEUQUEMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA	1.002.049.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.001.049.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.252.049.000	0	0	251.000.000	251.000.000	1.001.049.000		

TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA

8.883.283.000	2.552.398.902	2.450.000	1.562.498.000	1.560.048.000	4.768.386.098
----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

COMUNA DE SAN PABLO

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40048761	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	1.131.350.000	21.991.200	0	99.000.000	99.000.000	1.010.358.800	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	40043228	REPOSICION CANCHA VILLA SAN PABLO, COMUNA SAN PABLO	51.887.000	30.860.034	0	1.026.966	1.026.966	20.000.000	RS	EJECUCION
TOTAL							1.183.237.000	52.851.234	0	100.026.966	100.026.966	1.030.358.800		

INICIATIVAS NUEVAS

29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	126.702.000	0	126.140.000	126.702.000	562.000	0	RS*	CONVENIO
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40059680	ADQUISICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, SAN PABLO	274.086.000	0	120.576.750	274.085.000	153.508.250	1.000	RS*	CONVENIO
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40069510	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES VARIOS DEPARTAMENTOS, SAN PABLO	160.330.000	0	0	160.330.000	160.330.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40070438	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTORES PUTABLA, QUILEN Y CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO	406.477.000	0	0	1.000.000	1.000.000	405.477.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40074170	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO, SECTOR MAILE, COMUNA DE SAN PABLO	286.355.000	0	0	100.000.000	100.000.000	186.355.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.253.950.000	0	246.716.750	662.117.000	415.400.250	591.833.000		

TOTAL COMUNA DE SAN PABLO

2.437.187.000	52.851.234	246.716.750	762.143.966	515.427.216	1.622.191.800
----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

PROVINCIALES

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO	2.950.334.000	44.744.000	0	900.000.000	900.000.000	2.005.590.000	RS	REEVALUACION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30123182	CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO	6.137.198.000	4.121.575.186	0	1.000.000	1.000.000	2.014.622.814	CF	LIQUIDACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40029293	CONSTRUCCION BASE SAMU RAHUE, OSORNO	288.170.000	283.080.799	0	5.089.201	5.089.201	0	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40044996	REPOSICION VEHICULOS Y ADQUISICION MAQUINARIAS DE ASFALTO PARA LA D.V REGION DE LOS LAGOS	1.082.713.000	913.329.902	0	153.624.240	153.624.240	15.758.858	RS*	EJECUCION
TOTAL							10.458.415.000	5.362.729.887	0	1.059.713.441	1.059.713.441	4.035.971.672		

TOTAL PROVINCIALES

10.458.415.000	5.362.729.887	0	1.059.713.441	1.059.713.441	4.035.971.672
-----------------------	----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL PROVINCIA DE OSORNO

104.356.473.756	43.464.641.182	1.469.060.082	16.069.589.116	14.600.529.034	44.815.369.458
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

COMUNA DE PUERTO MONTT

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30072731	MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	9.191.489.000	8.964.989.987	0	1.000.000	1.000.000	225.499.013	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077490	CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT	4.060.161.100	3.978.756.124	0	81.404.976	81.404.976	0	RS*	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30270222	REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT	791.422.000	15.250.000	0	50.000.000	50.000.000	726.172.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080922	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT	676.991.000	15.250.000	0	50.000.000	50.000.000	611.741.000	RS	EJECUCION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	840.037.624	0	0	531.742.650	531.742.650	308.294.974	RS*	REEVALUACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40033774	REPOSICION CAMIONES Y MAQUINARIAS - MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT	1.362.125.000	883.195.617	0	478.929.383	478.929.383	0	RS*	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	FAR	EJECUCION	30106468	REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT	8.779.570.158	8.472.385.394	0	182.377.187	182.377.187	124.807.577	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30115395	CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT	2.484.881.860	1.624.763.093	462.856.055	449.000.000	-13.856.055	411.118.767	RE	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	20195455	MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT	2.791.798.000	262.200	0	200.000.000	200.000.000	2.591.535.800	RS	EXPROIACIONES
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40009792	CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA, PUERTO MONTT	1.000.117.739	0	0	150.000.000	150.000.000	850.117.739	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30080921	REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT	1.309.135.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.259.135.000	RS	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40035805	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL, PUERTO MONTT	980.175.000	0	0	50.000.000	50.000.000	930.175.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056949	CONSERVACION CALLES COMUNA DE PUERTO MONTT	1.934.861.516	1.293.352.495	126.171.162	391.533.321	265.362.159	249.975.700	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	PREFACTIBILIDAD	40058437	CONSTRUCCION DESNIVEL ROTONDA AV. SALVADOR ALLENDE - PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	246.329.000	0	0	30.000.000	30.000.000	216.329.000	RS	CONVENIO
TOTAL							36.449.093.997	25.248.204.910	589.027.217	2.695.987.517	2.106.960.300	8.504.901.570		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30034826	REPOSICION POSTA ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.396.009.000	1.863.000	0	50.000.000	50.000.000	1.344.146.000	RS	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005337	REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT	1.263.261.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.213.261.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40067945	MEJORAMIENTO CALLE CALETERA AV. PARQUE INDUSTRIAL, PUERTO MONTT	898.600.000	0	0	50.000.000	50.000.000	848.600.000	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129873	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL PUERTO MONTT	225.461.000	0	0	25.000.000	25.000.000	200.461.000	RS	
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071848	MEJORAMIENTO CALLE GÉNESIS E INMACULADA, COMUNA DE PUERTO MONTT	1.530.350.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.529.350.000	RS	
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40070609	ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE MIXTO SEGURIDAD PÚBLICA, COMUNA DE PUERTO MONTT	330.939.000	0	0	330.939.000	330.939.000	0	RS*	
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.644.620.000	1.863.000	0	506.939.000	506.939.000	5.135.818.000		

TOTAL COMUNA DE P. MONTT	42.093.713.997	25.250.067.910	589.027.217	3.202.926.517	2.613.899.300	13.640.719.570
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

COMUNA DE CALBUCO

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20086686	REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO, CALBUCO	16.168.723.293	14.193.669.885	0	1.946.302.280	1.946.302.280	28.751.128	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	RSD	EJECUCION	30135967	CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA, CALBUCO	1.666.209.546	1.036.752.441	0	1.000.000	1.000.000	628.457.105	RS	LIQUIDACION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30465134	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO	110.000.000	93.500.000	0	16.500.000	16.500.000	0	RS*	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20181416	REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO	1.359.482.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.309.482.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40049581	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA QUEULLÍN	984.384.000	0	0	650.000.000	650.000.000	334.384.000	RS*	LICITACION
TOTAL							20.288.798.839	15.323.922.326	0	2.663.802.280	2.663.802.280	2.301.074.233		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40055239	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES VILLARROEL Y C. CONDELL, CALBUCO	2.800.863.000	0	0	200.000.000	200.000.000	2.600.863.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40055163	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA PULUQUI	1.221.535.000	0	0	600.000.000	600.000.000	621.535.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							4.022.398.000	0	0	800.000.000	800.000.000	3.222.398.000		

TOTAL COMUNA DE CALBUCO	24.311.196.839	15.323.922.326	0	3.463.802.280	3.463.802.280	5.523.472.233
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------

COMUNA DE COCHAMO

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PEDZE	DISEÑO	40006863	REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO	129.430.000	68.272.200	0	15.000.000	15.000.000	46.157.800	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40015801	REPOSICION ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ PARIS, LLANADA GRANDE, COCHAMO	122.370.000	0	0	10.000.000	10.000.000	112.370.000	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40003812	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO PUELO	480.875.535	40.561.764	59.029.545	350.000.000	290.970.455	90.313.771	RS*	CONVENIO
31	02	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	40019209	HABILITACION SUMINISTRO E.E. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES DIVERSOS SECTORES COCHAMO	2.847.592.000	0	0	300.000.000	300.000.000	2.547.592.000	RS	LICITACION
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40047291	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA COMUNA DE COCHAMÓ	313.294.423	277.916.143	10.949.557	35.378.280	24.428.723	0	RS*	LICITACION
TOTAL							3.893.561.958	386.750.107	69.979.102	710.378.280	640.399.178	2.796.433.571		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40015528	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LLANADA GRANDE, COMUNA COCHAMO	1.556.268.000	29.558.750	0	100.000.000	100.000.000	1.426.709.250	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30085125	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO	1.569.748.000	16.944.000	0	100.000.000	100.000.000	1.452.804.000	RS	EJECUCION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40005745	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ	1.053.383.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.003.383.000	RS	CONVENIO
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40070102	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL POCOIHUEN, COCHAMO	3.769.266.000	0	0	200.000.000	200.000.000	3.569.266.000	RS	CONVENIO
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	332.627.000	0	0	332.627.000	332.627.000	0	RS*	CONVENIO
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40071715	REPOSICION VEHICULOS RECOLECTORES Y ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE COCHAMO	38.641.000	0	0	38.641.000	38.641.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							8.319.933.000	46.502.750	0	821.268.000	821.268.000	7.452.162.250		

TOTAL COMUNA DE COCHAMO	12.213.494.958	433.252.857	69.979.102	1.531.646.280	1.461.667.178	10.248.595.821
--------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

COMUNA DE FRESIA

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30282773	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA	538.319.065	406.794.679	0	131.524.386	131.524.386	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30212472	CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑO, FRESIA	490.790.000	424.766.706	0	66.023.294	66.023.294	0	RS	REEVALUACION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30134714	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA	1.459.195.698	564.573.930	105.885.368	825.496.546	719.611.178	69.125.222	RS	EJECUCION
29	05	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	30340925	REPOSICION EQUIPOS LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE FRESIA	650.972.000	0	0	65.097.200	65.097.200	585.874.800	RS*	REEVALUACION
TOTAL							3.139.276.763	1.396.135.315	105.885.368	1.088.141.426	982.256.058	655.000.022		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30435722	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, FRESIA	3.300.950.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.299.950.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS LICITACION / ADJUDICACION							3.300.950.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.299.950.000		

TOTAL COMUNA DE FRESIA	6.440.226.763	1.396.135.315	105.885.368	1.089.141.426	983.256.058	3.954.950.022
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

COMUNA DE FRUTILLAR

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485133	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PEDERNAL, FRUTILLAR	449.572.000	362.566.601	0	87.005.399	87.005.399	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30485157	AMPLIACION SISTEMA APR CASMA HACIA EL ENCANTO Y CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR	324.957.598	265.791.772	0	59.165.826	59.165.826	0	RS	PARALIZADA
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	30077932	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO	400.000.000	234.000.000	0	166.000.000	166.000.000	0	RS	EJECUCION

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013412	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CASMA, FRUTILLAR	1.222.519.000	154.611.365	85.303.125	541.664.700	456.361.575	526.242.935	RS	LICITACION
TOTAL							2.397.048.598	1.016.969.738	85.303.125	853.835.925	768.532.800	526.242.935		
INICIATIVAS NUEVAS														
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40025466	MEJORAMIENTO AVENIDA ARTURO ALESSANDRI NORTE, COMUNA DE FRUTILLAR	4.033.866.000	1.521.177	949.340.987	800.000.000	-149.340.987	3.232.344.823	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071230	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CASMA, COMUNA DE FRUTILLAR	228.318.000	0	0	150.000.000	150.000.000	78.318.000	RS	CONVENIO
29	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	485.755.000	0	0	485.755.000	485.755.000	0	RS	CONVENIO
29	05	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40070410	ADQUISICION Y REPOSICION DE MAQUINARIAS Y VEHICULO PARA ASEO Y ORNATO, FRUTILLAR	103.582.000	0	0	103.582.000	103.582.000	0	RS	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40069991	CONSTRUCCION MÓDULOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA RED DE SALUD COMUNAL DE FRUTILLAR	336.469.000	0	0	120.000.000	120.000.000	216.469.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40066152	CONSTRUCCION ESPACIO DE ENTRENAMIENTO PARA LAS ARTES MARCIALES, COMUNA DE FRUTILLAR.	315.077.000	0	0	120.000.000	120.000.000	195.077.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.503.067.000	1.521.177	949.340.987	1.779.337.000	829.996.013	3.722.208.823		
TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR							7.900.115.598	1.018.490.915	1.034.644.112	2.633.172.925	1.598.528.813	4.248.451.758		
COMUNA DE LLANQUIHUE														
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO														
31	01	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40019376	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LLANQUIHUE	436.621.000	201.612.460	0	235.008.540	235.008.540	0	RS	EJECUCION
TOTAL							436.621.000	201.612.460	0	235.008.540	235.008.540	0		
INICIATIVAS NUEVAS														
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40054960	ADQUISICION EQUIPO MAMOGRAFO HOSPITAL DE LLANQUIHUE	401.224.000	0	341.530.000	401.224.000	59.694.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							401.224.000	0	341.530.000	401.224.000	59.694.000	0		
TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE							837.845.000	201.612.460	341.530.000	636.232.540	294.702.540	0		
COMUNA DE LOS MUERMOS														
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO														
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40018868	REPOSICION CUARTEL GENERAL Y PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS LOS MUERMOS	1.546.425.858	556.757.937	0	150.000.000	150.000.000	839.667.921	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40024945	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL CUMBRE ALTA, LOS MUERMOS	1.324.261.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.274.261.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40049194	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES SECTOR CAÑITAS, ETAPA II, COMUNA DE LOS MUERMOS	1.171.957.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.121.957.000	RS	CONVENIO
TOTAL							4.042.643.858	556.757.937	0	250.000.000	250.000.000	3.235.885.921		
TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS							4.042.643.858	556.757.937	0	250.000.000	250.000.000	3.235.885.921		
COMUNA DE MAULLIN														
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO														
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007573	REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN	137.618.000	0	0	10.000.000	10.000.000	127.618.000	RS	REEVALUACION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30399945	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	62.456.000	0	0	15.000.000	15.000.000	47.456.000	RS	CONVENIO
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40007939	REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN	1.268.796.681	0	0	126.879.668	126.879.668	1.141.917.013	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038150	MEJORAMIENTO 5 CALLES DE MAULLIN URBANO, COMUNA DE MAULLIN	929.674.000	0	0	897.674.000	897.674.000	32.000.000	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40005800	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN	1.169.469.000	3.034.999	0	189.874.001	189.874.001	976.560.000	RS	EJECUCION
TOTAL							3.568.013.681	3.034.999	0	1.239.427.669	1.239.427.669	2.325.551.013		
INICIATIVAS NUEVAS														
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30134574	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN	1.167.917.000	3.213.175	0	200.000.000	200.000.000	964.703.825	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	366.003.000	0	0	300.516.808	300.516.808	65.486.192	RS*	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40020478	ADQUISICION MAQUINARIA PESADA COMUNA DE MAULLIN	286.015.000	0	94.010.000	182.335.000	88.325.000	103.680.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30395422	REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN	964.982.000	0	0	10.000.000	10.000.000	954.982.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40057978	REPOSICION 3RA. COMISARIA MAULLIN	378.161.000	0	0	25.000.000	25.000.000	353.161.000	RS	CONVENIO
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073466	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE MAULLIN	300.000.000	0	0	70.125.999	70.125.999	229.874.001	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.463.078.000	3.213.175	94.010.000	787.977.807	693.967.807	2.671.887.018		
TOTAL COMUNA DE MAULLIN							7.031.091.681	6.248.174	94.010.000	2.027.405.476	1.933.395.476	4.997.438.031		
COMUNA DE PUERTO VARAS														
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO														
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30064230	REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS	5.391.441.000	1.076.381.867	0	500.000.000	500.000.000	3.815.059.133	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	30204522	REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS	2.192.357.990	2.133.693.520	18.802.000	13.593.850	-5.208.150	45.070.620	RS	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40023990	DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PUERTO VARAS, ETAPA I	200.000.000	160.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	30485331	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS	1.185.683.550	1.080.697.996	0	104.985.554	104.985.554	0	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	PIR	EJECUCION	30125885	CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS	1.064.650.280	927.995.201	0	136.655.079	136.655.079	0	RS	EJECUCION
31	02	ENERGIA	NERGIZACION	EJECUCION	40019241	CONSTRUCCION SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES LAGO TODOS LOS SANTOS, PUERTO VARAS	870.094.000	125.778.069	0	739.024.273	739.024.273	5.291.658	RS	EJECUCION

TOTAL	10.904.226.820	5.504.546.653	18.802.000	1.534.258.756	1.515.456.756	3.865.421.411
--------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40019874	RESTAURACION TEMPLO PARROQUIAL EL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS	286.746.000	535.576	0	4.000.000	4.000.000	282.210.424	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30087304	REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA, PUERTO VARAS	1.362.466.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.262.466.000	RS	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40042377	MEJORAMIENTO CALLES MANZANAL Y LOS ÁNGELES, COMUNA DE PUERTO VARAS	995.184.000	791.204.753	54.582.436	1.000.000	-53.582.436	202.979.247	RS	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	FAR	EJECUCION	40064856	CONSERVACION VÍAS URBANAS DE PUERTO VARAS	920.256.000	0	0	1.000.000	1.000.000	919.256.000	RS	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40073778	MEJORAMIENTO MERCADO PIO NONO, COMUNA DE PUERTO VARAS	326.450.000	0	0	120.000.000	120.000.000	206.450.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.891.102.000	791.740.329	54.582.436	226.000.000	171.417.564	2.873.361.671		

TOTAL COMUNA DE P.VARAS	14.795.328.820	6.296.286.982	73.384.436	1.760.258.756	1.686.874.320	6.738.783.082
--------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PROVINCIALES

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30127010	MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT	3.980.896.039	3.898.127.708	0	1.000.000	1.000.000	81.768.331	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	PVP	EJECUCION	30077481	RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN	6.278.871.000	191.791.026	0	50.000.000	50.000.000	6.037.079.974	RS	LICITACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30380331	CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO	4.184.812.000	4.028.330.807	30.166.500	156.481.193	126.314.693	0	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	DISEÑO	40019576	MEJORAMIENTO COSTANERA JUAN SOLER, TRAMO COPIAPO – CHORRILLOS, PUERTO MONTT	262.261.000	119.176.269	0	30.000.000	30.000.000	113.084.731	RS	REEVALUACION
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40046863	REPOSICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL PUERTO MONTT, SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVÍ	2.208.718.000	1.859.973.874	0	50.000.000	50.000.000	298.744.126	RS*	EJECUCION
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	900.000.000	0	68.650.206	900.000.000	831.349.794	0	RS***	EJECUCION
24	03-004	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - MUNICIPALIDADES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							17.865.558.039	10.097.399.684	98.816.706	1.237.481.193	1.138.664.487	6.530.677.162		

INICIATIVAS NUEVAS

29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	662.322.000	0	0	264.928.800	264.928.800	397.393.200	RS*	CONVENIO
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063798	REPOSICION DE 6 AMBULANCIAS DE EMERGENCIA BASICA HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE	33.618.000	0	0	33.618.000	33.618.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40067969	CONSTRUCCION ETAPA 3, RELLENO SANITARIO PROVINCIAL LA LAJA	3.313.315.000	0	0	150.000.000	150.000.000	3.163.315.000	RS	Enviado a Unidad Técnica a Licitat
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							4.009.255.000	0	0	448.546.800	448.546.800	3.560.708.200		

TOTAL PROVINCIALES	21.874.813.039	10.097.399.684	98.816.706	1.686.027.993	1.587.211.287	10.091.385.362
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE	141.540.470.553	60.580.174.560	2.407.276.941	18.280.614.193	15.873.337.252	62.679.681.800
--------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

COMUNA DE ANCUD

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	RECURSOS HIDRICOS	SS	EJECUCION	40025619	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA LOS AROMOS Y RÍO PUDETO, ANCUD	2.028.170.000	1.642.222.023	0	385.947.977	385.947.977	0	RE	REEVALUACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40008322	CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	1.370.127.000	536.417.502	0	100.000.000	100.000.000	733.709.498	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30214722	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL DE GUABUN, ANCUD	1.389.476.000	808.091.051	70.395.111	581.384.949	510.989.838	0	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40041565	ADQUISICION DE DOS RETROEXCAVADORAS PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	311.458.000	0	311.244.500	311.458.000	213.500	0	RS*	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	30471852	INSTALACION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD	1.390.927.000	1.130.848.831	125.006.222	106.822.349	-18.183.873	153.255.820	RS	EJECUCION
TOTAL							6.490.158.000	4.117.579.407	506.645.833	1.485.613.275	978.967.442	886.965.318		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40014527	MEJORAMIENTO CALLE BAQUEDANO Y COSTANERA NORTE, COMUNA DE ANCUD	669.290.000	0	0	50.000.000	50.000.000	619.290.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30093353	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL SECTOR NAL, COMUNA DE ANCUD	1.459.839.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.409.839.000	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40057328	CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR CARACOLES, ANCUD	238.808.000	0	0	30.000.000	30.000.000	208.808.000	RS	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40045547	CONSTRUCCION CUARTEL 2A COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD	103.460.000	0	0	50.000.000	50.000.000	53.460.000	RS	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	566.881.000	0	0	183.440.500	183.440.500	383.440.500	RS*	CONVENIO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40061816	REPOSICION MAQUINARIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD ANCUD	422.079.000	0	0	211.039.500	211.039.500	211.039.500	RS*	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40071987	REPOSICIÓN TALLER DE OPERACIONES.	278.478.000	0	0	120.000.000	120.000.000	158.478.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							3.738.835.000	0	0	694.480.000	694.480.000	3.044.355.000		

TOTAL COMUNA DE ANCUD	10.228.993.000	4.117.579.407	506.645.833	2.180.093.275	1.673.447.442	3.931.320.318
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

COMUNA DE CASTRO

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	20140221	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELÍN, CASTRO	844.703.000	542.161.724	2.012.625	302.541.276	300.528.651	0	RS	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30076949	REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO	15.185.444.000	6.845.169.786	2.110.294.156	5.255.379.661	3.145.085.505	3.084.894.553	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40048286	CONSTRUCCION REDES SANITARIAS Y URBANIZACIONES COMPLEMENTARIAS DIVERSOS SECTORES DE CASTRO	2.394.442.000	0	0	100.000.000	100.000.000	2.294.442.000	RS	LICITACION
TOTAL							18.424.589.000	7.387.331.510	2.112.306.781	5.657.920.937	3.545.614.156	5.379.336.553		

INICIATIVAS NUEVAS

29	04	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	128.911.000	0	0	128.911.000	128.911.000	0	RS*	CONVENIO
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058065	REPOSICION MOBILIARIO CLÍNICO EN ATENCIÓN CERRADA DEL HOSPITAL DE CASTRO	600.874.000	0	0	380.685.856	380.685.856	220.188.144	RS*	CONVENIO
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	40070257	MEJORAMIENTO PLAZA JAVIERA CARRERA CASTRO	336.417.000	0	0	120.000.000	120.000.000	216.417.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.066.202.000	0	0	629.596.856	629.596.856	436.605.144		

TOTAL COMUNA DE CASTRO

19.490.791.000	7.387.331.510	2.112.306.781	6.287.517.793	4.175.211.012	5.815.941.697
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

COMUNA DE CHONCHI

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	30126487	REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI	92.764.367	61.313.682	0	1.000.000	1.000.000	30.450.685	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	20157700	REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI	4.787.424.000	3.123.618.991	548.427.872	1.129.933.999	581.506.127	533.871.010	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30484959	CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI	3.727.724.000	1.945.000	186.175.158	420.124.000	233.948.842	3.305.655.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40031425	CONSTRUCCION SERVICIOS DE AP Y ALCANT. DE SEC. CENTENARIO Y PROLONGACIÓN P. A. CERDA, CHONCHI	2.394.442.000	0	0	50.000.000	50.000.000	2.344.442.000	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013031	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL NATRI, CHONCHI	1.290.291.000	0	0	99.000.000	99.000.000	1.191.291.000	RS	LICITACION
TOTAL							12.292.645.367	3.186.877.673	734.603.030	1.700.057.999	965.454.969	7.405.709.695		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40052247	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ESMERALDA, COMUNA DE CHONCHI	555.683.000	0	0	50.000.000	50.000.000	444.546.400	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40010316	CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA HUILLINCO, COMUNA DE CHONCHI	603.419.000	0	0	350.000.000	350.000.000	253.419.000	RS*	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40040291	CONSERVACION DE PAVIMENTACIÓN CALLE BERNARDO O'HIGGINS, COMUNA DE CHONCHI	326.471.000	0	0	200.000.000	200.000.000	126.471.000	RS*	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40071482	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS EN SECTOR NORESTE, COMUNA DE CHONCHI	806.312.000	0	0	1.000.000	1.000.000	805.312.000	RS	CONVENIO
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039346	REPOSICION DE 2 AMBULANCIAS BASICAS PARA LA COMUNA DE CHONCHI	309.400.000	0	0	309.400.000	309.400.000	0	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.601.285.000	0	0	910.400.000	910.400.000	1.629.748.400		

TOTAL COMUNA DE CHONCHI

14.893.930.367	3.186.877.673	734.603.030	2.610.457.999	1.875.854.969	9.035.458.095
-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

COMUNA DE CURACO DE VELEZ

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ	190.867.000	103.039.646	0	56.508.734	56.508.734	31.318.620	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30072730	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ	394.951.000	37.849.624	0	200.000.000	200.000.000	157.101.376	RS	EJECUCION
TOTAL							585.818.000	140.889.270	0	256.508.734	256.508.734	188.419.996		

INICIATIVAS NUEVAS

29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	173.145.000	166.622.433	0	6.522.567	6.522.567	0	RS*	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40060989	REPOSICION Y ADQUISICION MAQUINARIA MUNICIPAL, CURACO DE VELEZ	265.941.412	131.141.412	2.999.588	134.800.000	131.800.412	0	RS*	LICITACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063532	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES, CURACO DE VELEZ	498.111.000	0	0	350.000.000	350.000.000	148.111.000	RS*	LICITACION
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40051701	REPOSICION CUARTEL TERCERA COMPAÑIA BOMBEROS DE HUAYR ALTO, CURACO DE VÉLEZ	115.920.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100.920.000	RS	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056255	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 8 SECTORES RURALES, CURACO DE VÉLEZ	790.967.000	0	0	500.000.000	500.000.000	290.967.000	RS*	Enviado a Unidad Técnica a Licitat
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.844.084.412	297.763.845	2.999.588	1.006.322.567	1.003.322.979	539.998.000		

TOTAL COMUNA DE C.VELEZ

2.429.902.412	438.653.115	2.999.588	1.262.831.301	1.259.831.713	728.417.996
----------------------	--------------------	------------------	----------------------	----------------------	--------------------

COMUNA DE DALCAHUE

INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40017878	CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUPETRA	1.414.744.060	1.209.705.869	102.646.778	205.038.191	102.391.413	0	RS	EJECUCION
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30129912	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE	2.970.033.000	8.950.000	0	50.000.000	50.000.000	2.911.083.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40052180	CONSTRUCCION SSR SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE	41.884.000	16.200.000	12.150.000	13.534.000	1.384.000	12.150.000	RS	EJECUCION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40053067	CONSTRUCCION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTOR 18 DE SEP, COMUNA DE DALCAHUE	1.149.483.000	217.065.774	58.853.696	600.000.000	541.146.304	332.417.226	RS*	EJECUCION
TOTAL							5.576.144.060	1.451.921.643	173.650.474	868.572.191	694.921.717	3.255.650.226		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40061640	REPOSICION POSTA SALUD RURAL CALEN, COMUNA DE DALCAHUE	1.284.197.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.234.197.000	RS	LICITACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	40054303	AMPLIACION REDES DE A. POTABLE, ALCANT Y CONSTR. MURO DE CONTEN. AVDA. MOCOPULLI, DALCAHUE	2.085.979.000	0	0	100.000.000	100.000.000	1.985.979.000	RS	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40001662	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE	1.940.477.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.890.477.000	RS	CONVENIO
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	DISEÑO	40026493	CONSTRUCCION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE DALCAHUE	68.437.000	0	0	2.085.978	2.085.978	66.351.022	RS	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40070836	REPOSICION BUS MUNICIPAL, COMUNA DE DALCAHUE	310.000.000	0	0	310.000.000	310.000.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.689.090.000	0	0	512.085.978	512.085.978	5.177.004.022		

TOTAL COMUNA DE DALCAHUE	11.265.234.060	1.451.921.643	173.650.474	1.380.658.169	1.207.007.695	8.432.654.248						
---------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30042613	NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON	3.299.636.000	2.724.474.841	0	50.000.000	50.000.000	525.161.159	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40028442	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE DETIF, PUQUELDON	1.574.814.000	8.800.655	0	300.000.000	300.000.000	1.266.013.345	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	717.773.000	593.250.434	122.570.000	124.522.566	1.952.566	0	RS*	CONVENIO
29	03	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40013818	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS VECINALES, COMUNA PUQUELDON	305.443.000	144.571.791	115.701.320	160.871.209	45.169.889	0	RS*	CONVENIO
TOTAL							5.897.666.000	3.471.097.721	238.271.320	635.393.775	397.122.455	1.791.174.504		

INICIATIVAS NUEVAS

29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	601.053.000	0	599.158.390	435.326.498	-163.831.892	165.726.502	RS*	CONVENIO
29	05	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40051860	ADQUISICION CONTENEDORES RSD Y RD, CAMION DE CARGA LATERAL Y CAMION CARGA TRASERA, PUQUELDON	361.859.000	0	361.635.961	180.929.500	-180.706.461	180.929.500	RS*	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40013816	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON	771.810.000	0	0	183.711.001	183.711.001	588.098.999	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.734.722.000	0	960.794.351	799.966.999	-160.827.352	934.755.001		

TOTAL COMUNA DE PUQUELDON	7.632.388.000	3.471.097.721	1.199.065.671	1.435.360.774	236.295.103	2.725.929.505						
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40002386	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709	RS	REEVALUACION
TOTAL							3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709		

TOTAL COMUNA DE QUEILEN	3.073.922.000	1.045.300.291	0	50.000.000	50.000.000	1.978.621.709						
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	40000178	INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN	46.350.000	36.000.000	0	10.350.000	10.350.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	DISEÑO	30488426	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON	28.825.000	5.765.000	0	23.060.000	23.060.000	0	RS	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30069919	CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN	1.411.317.146	0	0	5.000.000	5.000.000	1.406.317.146	RS	LICITACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40007743	REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON	130.090.000	117.081.000	0	5.000.000	5.000.000	8.009.000	RS	EJECUCION
TOTAL							1.616.582.146	158.846.000	0	43.410.000	43.410.000	1.414.326.146		

INICIATIVAS NUEVAS

29	03	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	363.037.000	0	0	363.037.000	363.037.000	0	RS*	CONVENIO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40043207	REPOSICION MAQUINARIA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, QUELLON	312.912.000	0	0	312.912.000	312.912.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							675.949.000	0	0	675.949.000	675.949.000	0		

TOTAL COMUNA DE QUELLON	2.292.531.146	158.846.000	0	719.359.000	719.359.000	1.414.326.146						
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40045829	HABILITACION Y MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	1.654.842.789	1.485.286.866	0	166.921.134	166.921.134	2.634.789	RS	EJECUCION
TOTAL							1.654.842.789	1.485.286.866	0	166.921.134	166.921.134	2.634.789		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40063487	CONSERVACION DE CAMINOS ISLAS TAUCULON, AULIN Y BUTACHAUQUES, COMUNA DE QUEMCHI.	974.355.000	0	0	500.000.000	500.000.000	474.355.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40005528	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI	700.908.000	0	0	100.000.000	100.000.000	600.908.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.675.263.000	0	0	600.000.000	600.000.000	1.075.263.000		

TOTAL COMUNA DE QUEMCHI	3.330.105.789	1.485.286.866	0	766.921.134	766.921.134	1.077.897.789						
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------	--------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO

31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40013068	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VILLA CHAULINEC, ISLA CHAULINEC - QUINCHAO	1.310.834.000	1.231.903.855	0	30.000.000	30.000.000	48.930.145	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40039350	REPOSICION POSTA SALUD RURAL LINGUA, COMUNA DE QUINCHAO	1.822.540.000	0	0	200.000.000	200.000.000	1.622.540.000	RE	REEVALUACION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40027221	REPOSICION ESCUELA RURAL DE ALAO, QUINCHAO	2.480.736.000	1.415.558.565	260.162.807	772.402.432	512.239.625	292.775.003	RS	EJECUCION
TOTAL							5.614.110.000	2.647.462.420	260.162.807	1.002.402.432	742.239.625	1.964.245.148		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40033589	RESTAURACION TEMPLO JESÚS NAZARENO DE CAGUACH, QUINCHAO	441.291.000	0	0	50.000.000	50.000.000	391.291.000	RS	EJECUCION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40067325	CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO	2.352.751.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.852.751.000	RS*	LICITACION
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.794.042.000	0	0	550.000.000	550.000.000	2.244.042.000		

TOTAL COMUNA DE QUINCHAO

**PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30381175	CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO	3.477.985.000	527.771.961	0	200.000.000	200.000.000	2.750.213.039	RS	REEVALUACION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083335	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE	5.020.949.434	4.955.228.139	0	1.000.000	1.000.000	64.721.295	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE	6.102.325.000	2.707.826.752	0	100.000.000	100.000.000	3.294.498.248	RE	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40019999	MEJORAMIENTO AVDA. GALVARINO RIVEROS NORTE DE CASTRO	17.878.003.000	6.411.745.496	3.398.926	200.000.000	196.601.074	11.266.257.504	RS	EJECUCION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40057047	REPOSICION VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE ASFALTO PARA LA D.V., PROVINCIA DE CHILOÉ	1.091.574.000	559.298.027	0	254.304.973	254.304.973	277.971.000	RS*	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40062497	DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIO INFRAEST. PORTUARIA 04 SECT. REZAGO, QUEMCHI-QUINCHAO Y QUELLON	194.763.000	143.246.250	0	1.000.000	1.000.000	50.516.750	RS	EJECUCION
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES- SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	2.449.000.000	0	1.687.574.643	2.449.000.000	761.425.357	0	RS***	EJECUCION
24	03	RECURSOS HIDRICOS	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA B) GLOSA 03 GESTIÓN HÍDRICA (Subtítulo 24.03.014)	140.080.000	0	0	140.080.000	140.080.000	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							36.354.679.434	15.305.116.625	1.690.973.569	3.345.384.973	1.654.411.404	17.704.177.836		

TOTAL PROVINCIALES

TOTAL PROVINCIA DE CHILOE

**COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

31	02	MULTISECTORIAL	PEDZE	EJECUCION	30103541	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN	4.255.389.000	25.800.000	0	200.000.000	200.000.000	4.029.589.000	RS	EJECUCION
29	03	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40058788	REPOSICION AMBULANCIAS COMUNA DE CHAITEN	172.000.000	0	0	17.200.000	17.200.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL							4.427.389.000	25.800.000	0	217.200.000	217.200.000	4.029.589.000		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40042493	MEJORAMIENTO DIVERASS CALLES SECTOR SUR, CHAITEN	6.383.540.000	0	0	0	0	6.383.540.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							6.383.540.000	0	0	0	0	6.383.540.000		

TOTAL COMUNA DE CHAITEN

**COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	EJECUCION	30341678	ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFÚ	126.058.000	75.660.000	0	50.398.000	50.398.000	0	RS*	EJECUCION
31	02	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	PEDZE	DISEÑO	30352430	CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	118.160.000	100.000.000	0	18.160.000	18.160.000	0	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40041636	REPOSICION POSTA SALUD RURAL EL ESPOLON COMUNA DE FUTALEUFU	1.415.585.000	44.597.047	0	100.000.000	100.000.000	1.270.987.953	RS	EJECUCION
TOTAL							1.659.803.000	220.257.047	0	168.558.000	168.558.000	1.270.987.953		

INICIATIVAS NUEVAS

31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40056911	CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DE 4 SECTORES RURALES COMUNA DE FUTALEUFU	722.117.000	0	0	300.000.000	300.000.000	422.117.000	RS*	LICITACION
26	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	30086361	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	0	RS*	CONVENIO
31	02	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40073440	MEJORAMIENTO PASEO ACCESO PONIENTE, COMUNA DE FUTALEUFU	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							1.102.117.000	0	0	450.000.000	450.000.000	652.117.000		

TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU

**COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO**

31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	DISEÑO	40047836	REPOSICION ESCUELA RURAL SEMILLERO DE ROLECHA, HUALAIHUÉ	254.796.000	88.920.096	0	165.875.904	165.875.904	0	RS	EJECUCION
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40037396	CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL EL MANZANO, HUALAIHUE	1.966.390.000	1.324.404.045	117.677.682	588.469.982	470.792.300	53.515.973	RS	EJECUCION
TOTAL							2.221.186.000	1.413.324.141	117.677.682	754.345.886	636.668.204	53.515.973		

INICIATIVAS NUEVAS														
31	02	DEPORTES	LIBRE	DISEÑO	30386191	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE HORNOPIREN, HUALAIHUE	81.700.000	15.600.000	0	66.100.000	66.100.000	0	RS	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	30397627	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA, COMUNA DE HUALAIHUE	1.446.756.000	696.150	0	50.000.000	50.000.000	1.396.059.850	RS	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	DISEÑO	40053338	CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS RIO NEGRO HORNOPIREN, HUALAIHUE	115.300.000	0	0	30.000.000	30.000.000	85.300.000	RS	CONVENIO
29	05	TRANSPORTE	LIBRE	EJECUCION	40065407	ADQUISICION MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COMUNA DE HUALAIHUE	341.685.000	0	0	170.842.500	170.842.500	170.842.500	RS*	CONVENIO
31	02	MULTISECTORIAL	LIBRE	DISEÑO	30129886	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE HUALAIHUE	344.715.000	0	0	35.000.000	35.000.000	309.715.000	RS	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							2.330.156.000	16.296.150	0	351.942.500	351.942.500	1.961.917.350		

TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE							4.551.342.000	1.429.620.291	117.677.682	1.106.288.386	988.610.704	2.015.433.323		
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--	--

COMUNA DE PALENA														
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO														
31	02	SEGURIDAD PUBLICA	PEDZE	EJECUCION	30115295	REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA	1.449.749.000	1.400.871.686	0	20.563.374	20.563.374	28.313.940	RS	EJECUCION
22	11	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LIBRE	EJECUCION	30474713	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA	130.000.000	14.325.000	0	70.675.000	70.675.000	45.000.000	RS*	EJECUCION
TOTAL							1.579.749.000	1.415.196.686	0	91.238.374	91.238.374	73.313.940		

INICIATIVAS NUEVAS														
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40072992	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLIMATIZACION, COLEGIO ROBERTO WHITE GESELL DE PALENA	541.587.000	0	0	100.000.000	100.000.000	441.587.000	RS	CONVENIO
31	02	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40007928	CONSTRUCCION CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA	4.529.799.000	0	0	250.000.000	250.000.000	4.279.799.000	RS	CONVENIO
29	03	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40076387	REPOSICION DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS	187.635.000	0	0	0	0	187.635.000	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							5.259.021.000	0	0	350.000.000	350.000.000	4.909.021.000		

TOTAL COMUNA DE PALENA							6.838.770.000	1.415.196.686	0	441.238.374	441.238.374	4.982.334.940		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------	--------------------	--------------------	----------------------	--	--

PROVINCIALES														
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO														
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30342673	CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN	16.612.042.000	4.059.795.859	0	3.205.198.628	3.205.198.628	9.347.047.513	RS	EJECUCION
31	02	SALUD	PEDZE	EJECUCION	30060589	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN.	34.164.961.000	9.817.932.092	1.615.356.979	3.405.634.191	1.790.277.212	20.941.394.717	RS	licitacion
31	02	TRANSPORTE	PEDZE	EJECUCION	30384677	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA	50.292.204.000	13.369.891.477	0	400.000.000	400.000.000	36.522.312.523	RS	EJECUCION
31	02	JUSTICIA	LIBRE	DISEÑO	30421729	REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN	29.599.000	0	0	1.000.000	1.000.000	28.599.000	S/R	SIN RS 2024
24	01-002	ENERGIA	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	APLICACIÓN LETRA A) GLOSA 03 ENERGÍA, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES - SUBSIDIO OPERACIÓN SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN ENERGÍA EN ZONAS AISLADAS	780.000.000	0	254.582.428	780.000.000	525.417.572	0	RS***	EJECUCION
TOTAL							101.878.806.000	27.247.619.428	1.869.939.407	7.791.832.819	5.921.893.412	66.839.353.753		

INICIATIVAS NUEVAS														
29	05	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40063704	REPOSICION EQUIPOS RAYOS X OSTEOPULMONARES HOSPITALES DE FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA	769.914.000	0	0	767.550.000	767.550.000	358.012.623	RS*	licitacion
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							769.914.000	0	0	767.550.000	767.550.000	358.012.623		

TOTAL PROVINCIALES							102.648.720.000	27.247.619.428	1.869.939.407	8.559.382.819	6.689.443.412	67.197.366.376		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--

TOTAL PROVINCIA DE PALENA							127.611.681.000	30.338.493.452	1.987.617.089	10.942.667.579	8.955.050.490	86.531.368.592		
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	--

REGIONALES														
INICIATIVAS EN EJECUCION /LIQUIDACION/ADJUDICACION/LICITACION/CONVENIO														
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	30430874	ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT	413.944.000	0	0	12.180.626	12.180.626	401.763.374	RS*	DETENIDO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40020318	REPOSICION VEHÍCULOS PDI, REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS	675.958.000	0	0	337.979.497	337.979.497	337.978.503	RS*	licitacion
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TR	EJECUCION	40032331	DIAGNOSTICO ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RSD Y SU GESTIÓN EN ZONAS DE REZAGO	219.884.000	208.722.500	0	11.161.500	11.161.500	0	RS*	EJECUCION
24	01-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PRIVADO)	6.400.000.000	0	21.078.087	6.400.000.000	6.378.921.913	0	RS***	EJECUCION
24	03-300	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	CONCURSO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (8% PUBLICO)	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	0	RS***	
24	03-011	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	SUBT 24	Aplicación letra c) glosa 03 Residuos Sólidos Domiciliarios	372.507.000	0	0	372.507.000	372.507.000	0	RS***	
33	03-125	MULTISECTORIAL	FRIL	EJECUCION	FRIL	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL	8.000.000.000	0	1.507.704.929	8.000.000.000	6.492.295.071	0	RS**	EJECUCION
TOTAL							16.282.293.000	208.722.500	1.528.783.016	15.333.828.623	13.805.045.607	739.741.877		

INICIATIVAS NUEVAS														
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40043670	DIAGNOSTICO CONDICIONES NAT. VARIOS SECT. ZONAS DE REZAGO SUR, REGION DE LOS LAGOS	1.622.642.000	627.486.611	0	578.942.460	578.942.460	416.212.929	RS	EJECUCION
31	01	TRANSPORTE	TR	EJECUCION	40032367	DIAGNOSTICO DE COND. NATURALES VARIOS SECTORES ZONAS DE REZAGO NORTE, REGION DE LOS LAGOS	1.512.982.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1.462.982.000	RS	LICITACION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40055194	ANALISIS POLÍTICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, REGIÓN DE LOS LAGOS.	258.500.000	0	0	218.250.875	218.250.875	40.249.125	RS*	LICITACION
22	11	MULTISECTORIAL	LIBRE	EJECUCION	40058442	ANALISIS POLITICA INDIGENA REGIONAL	253.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	238.000.000	RS*	CONVENIO
29	05	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40042999	REPOSICION DE EQUIPOS LABORATORIOS DE CARRERAS MARÍTIMAS DEL TECNOLÓGICO U LAGOS	570.505.000	0	0	28.992.305	28.992.305	541.512.695	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40032097	CONSTRUCCION ASCENSORES SECTOR CENTRO - CAR - EDIFICIO CONSISTORIAL, PUERTO MONTT	11.224.636.000	0	0	149.000.000	149.000.000	11.075.636.000	RS	LICITACION
29	05	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40038820	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CRUCES SEMAFORIZADOS	533.060.000	0	0	15.000.000	15.000.000	518.060.000	RS*	REEVALUACION
31	02	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	40046973	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES NUEVA ZONA PRIMARIA EXTRAPUERTO EMPORMONTT, PUERTO MONTT	3.614.118.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.613.118.000	RS	CONVENIO
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	142.300.000	0	0	142.300.000	142.300.000	0	RS*	LICITACION
29	05	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40058220	ADQUISICION DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA LA ZONA CARABINEROS LOS LAGOS	102.567.000	0	0	102.567.000	102.567.000	0	RS*	LICITACION
22	11	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	LIBRE	EJECUCION	40055362	ANALISIS PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LOS LAGOS	323.520.000	0	0	5.000.000	5.000.000	318.520.000	RS*	CONVENIO
31	02	DEPORTES	LIBRE	EJECUCION	40064760	CONSERVACION POLIDEPORTIVO ARENA PUERTO MONTT	1.803.653.000	0	0	500.000.000	500.000.000	1.303.653.000	S/R	CONVENIO
31	02	SALUD	LIBRE	EJECUCION	40036420	HABILITACION Centro Cardioquirúrgico para Macro Zona Sur Austral	2.494.106.000	442.023.638	77.158.500	1.029.999.999	952.841.499	1.022.082.363	RS	EJECUCION
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	40056853	CONSTRUCCION CAMPUS SALUD, INGENIERÍA Y ARTES, ULAGOS, PUERTO MONTT	6.641.168.000	0	0	100.000.000	100.000.000	6.541.168.000	RS	CONVENIO
31	02	EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO	LIBRE	EJECUCION	30091074	CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT	5.484.512.000	0	0	50.000.000	50.000.000	5.434.512.000	RS	ADJUDICACION
29	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40067537	ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA CUATRO CUARTELES FRONTERIZOS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS	167.421.000	0	0	167.421.000	167.421.000	0	RS*	CONVENIO
TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS							36.748.690.000	1.069.510.249	77.158.500	3.153.473.639	3.076.315.139	32.525.706.112		
TOTAL REGIONAL							53.030.983.000	1.278.232.749	1.605.941.516	18.487.302.262	16.881.360.746	33.265.447.989		

PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA Y TRANSFERENCIA BOMBEROS / FPD														
24	01	TRANSPORTE	FAR	EJECUCION	30429222	TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	4.500.000.000	0	RS***	EJECUCION
33	RTE A BO	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	EJECUCION	40072971	TRANSFERENCIA A JUNTA NACIONAL DE CUERPO DE BOMBEROS DE CHILE	3.231.105.000	0	0	3.231.105.000	3.231.105.000	0	RS**	CONVENIO
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	EJECUCION	FPD	PROVISIÓN FONDO REGIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO (SIN DISTRIBUIR)	4.233.266.000	0	0	4.233.266.000	4.233.266.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
33	03	MULTISECTORIAL	FAR	EJECUCION	FATPCR	FONDO DE APOYO AL TRANSPORTE PUBLICO Y LA CONECTIVIDAD REGIONAL (SIN DISTRIBUIR)	6.026.658.000	0	0	6.026.658.000	6.026.658.000	0	RS**	SIN DISTRIBUIR
TOTAL							17.991.029.000	0	0	17.991.029.000	17.991.029.000	0		

TOTAL							17.991.029.000	0	0	17.991.029.000	17.991.029.000	0		
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------	--	--

PROGRAMAS DE ARRASTRE														
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	CORFO	40033084	CAPACITACION APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL TERRITORIO PATAGONIA	2.082.000.000	1.231.188.809	0	200.000.000	200.000.000	650.811.191	RS**	EJECUCION
33	03	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	FRPD	SEREMI DE AGRICULTURA	40024244	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA RED AFC DE CRIANCEROS DE TERNEROS LECHEROS	322.800.000	239.073.000	0	33.150.000	33.150.000	50.577.000	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	COMISION NACIONAL DE RIEGO	40014466	CAPACITACION Y FOMENTO PARA FORTALECER EL RIEGO TECNIFICADO EN LA REGION DE LOS LAGOS	2.040.000.000	1.388.809.167	0	119.308.000	119.308.000	531.882.833	RS**	EJECUCION
33	03	TRANSPORTE	FRPD	SUBTEL	40029246	TRANSFERENCIA HABILITACION OFERTA DE SERVICIOS DE INTERNET DOMICILIARIO ULTIMA MILLA, REGION X	14.980.000.000	1.823.578.319	0	1.750.122.000	1.750.122.000	11.406.299.681	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057162	CAPACITACION FOMENTO PRODUCTIVO FORRAJERO PARA BOVINOS DE CARNE DE LA PROVINCIA DE PALENA	1.179.549.878	428.154.116	0	748.375.000	748.375.000	3.020.762	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057135	TRANSFERENCIA RECUPER Y FORTALECIM DEL MANEJO SUSTENTABLE DE SUELOS PARA COM INDIG PROV OSORNO	1.250.001.000	608.377.496	0	640.355.000	640.355.000	1.268.504	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057165	CAPACITACION RECUP, CONSERV Y MEJOR DE SUELOS EN TERRITORIOS INDÍG PROV LLANQ CHILOE Y PALENA	700.001.000	345.714.459	0	351.681.000	351.681.000	2.605.541	RS**	EJECUCION
33	03	AGRICULTURA	FRPD	INDAP	40057256	TRANSFERENCIA CAP E INV SILVOAGROP PARA TECNIFIC Y REACTIV ECON DE CAMP, REGION LOS LAGOS	700.000.000	385.283.360	0	299.178.000	299.178.000	15.538.640	RS**	EJECUCION
33	03	PESCA	FRPD	INDESPA	40063557	TRANSFERENCIA PROGRAMA TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL REGIÓN DE LOS LAGOS	2.900.000.000	604.099.000	0	1.295.901.000	1.295.901.000	1.000.000.000	RS**	EJECUCION
33	03	TURISMO Y COMERCIO	FRPD	SERNATUR	40064817	TRANSFERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.750.000.000	450.150.010	0	1.299.836.000	1.299.836.000	13.990	RS**	EJECUCION
33	03	TRANSPORTE	FAR	MIN. DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	40057681	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE BUSES ELECTRICOS EN PUERTO VARAS	7.782.000.000	0	0	91.000.000	91.000.000	7.691.000.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40057182	TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTOS COOPERATIVO LOS LAGOS	1.174.400.000	29.375.709	0	1.145.024.000	1.145.024.000	291	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	SERCOTEC	40017797	TRANSFERENCIA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA EN ECONOMÍA CIRCULAR	210.000.960	183.817.960	0	26.183.000	26.183.000	0	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	CORFO	40067360	CAPACITACION CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA REGION DE LOS LAGOS	4.850.000.000	0	0	1.321.000.000	1.321.000.000	3.529.000.000	RS**	EJECUCION

33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad Austral de Chile	40075384	TRANSFERENCIA CONECTACOOOP CIRCULAR, PROGRAMA DE INCUBACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA DESARROLLAR	266.852.000	20.416.000	0	147.133.000	147.133.000	99.303.000	RS**	EJECUCION
33	01	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad San Sebastián	40075417	TRANSFERENCIA SOLUCIONES SOCIO SANITARIAS PARA LA VISITACIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE ÁREA	243.000.000	20.416.000	0	214.302.000	214.302.000	8.282.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Santiago de Chile	40075430	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA MITILICULTORA	300.000.000	1.000.000	0	114.777.000	114.777.000	184.223.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Chile	40075429	TRANSFERENCIA VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO DE COSECHA DE AGUA SUBSUPERFICIAL Y DESARROLLO DE EST	174.060.000	0	0	103.875.000	103.875.000	70.185.000	RS**	EJECUCION
33	03	MULTISECTORIAL	FRPD	Universidad de Los Lagos	40075416	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO MARÍTIMO PORTUARIO EN EL MARCO	300.000.000	752.000	0	218.405.000	218.405.000	80.843.000	RS**	EJECUCION
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE							43.204.664.838	7.760.205.405	0	10.119.605.000	10.119.605.000	25.324.854.433		
PROGRAMAS SALUD														
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD DE CHILOE	40056363	PROGRAMA DE PESQUISA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CANCER DIGESTIVO EN LA PROVINCIA DE CHILOE	608.214.000	583.423.000	0	24.790.000	24.790.000	1.000	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40057736	PROGRAMA DE PROMOCION, PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DE CANCERES MAS PREVALENTES EN LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE OSORNO	500.000.000	458.564.000	0	100.000.000	100.000.000	-58.564.000	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD OSORNO	40001626	PROGRAMA DE RESOLUCION DE ORTODONCIA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y REGION DE LOS LAGOS CONSTRUYENDO NUEVAS SONRISAS	600.000.000	480.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	RS**	EJECUCION
24	03	SALUD	LIBRE	SERVICIO SALUD RELONCAVI	40056811	CONTROL Y TRATAMIENTO PACIENTES ONCOLÓGICOS SERVICIO DE SALUD RELONCAVÍ	1.574.000.000	504.035.000	0	454.800.000	454.800.000	615.165.000	RS**	EJECUCION
TOTAL PROGRAMAS ARRASTRE							3.282.214.000	2.026.022.000	0	699.590.000	699.590.000	556.602.000		
PROGRAMAS NUEVOS														
24	03	SEGURIDAD PUBLICA	LIBRE	SENDA	40072688	PREVENCION Senda - GORE Los Lagos: Más Comunidad, Más Prevención	333.537.000	0	0	156.724.000	156.724.000	176.813.000	RS**	
24	03	MULTISECTORIAL	FRPD	GORE Los Lagos		Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la Gestión Municipal	710.745.000	0	0	237.000.000	237.000.000	473.745.000	RS**	
TOTAL PROGRAMAS NUEVOS							1.044.282.000	0	0	393.724.000	393.724.000	650.558.000		
TOTAL PROGRAMAS							47.531.160.838	9.786.227.405	0	11.212.919.000	11.212.919.000	26.532.014.433		
TOTAL SUBTITULO 33 (NO INCLUYE FRIL)							65.522.189.838	9.786.227.405	0	29.203.948.000	29.203.948.000	26.532.014.433		
TOTAL PRESUPUESTO FNDR 2025							611.462.427.355	186.143.242.619	14.150.303.381	114.575.108.000	100.424.804.619	310.876.914.759		

RATE
RS=RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE
RS*=RECOMENDACIÓN TÉCNICA CIRCULAR 33
RS**=RECOMENDACIÓN POR TRANSFERENCIA
RS***=RECOMENDACIÓN POR SUBSIDIO
CF=CONTINUIDAD FAVORABLE
RE=REEVALUACIÓN
IN=INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
S/R=SIN RATE 2025
